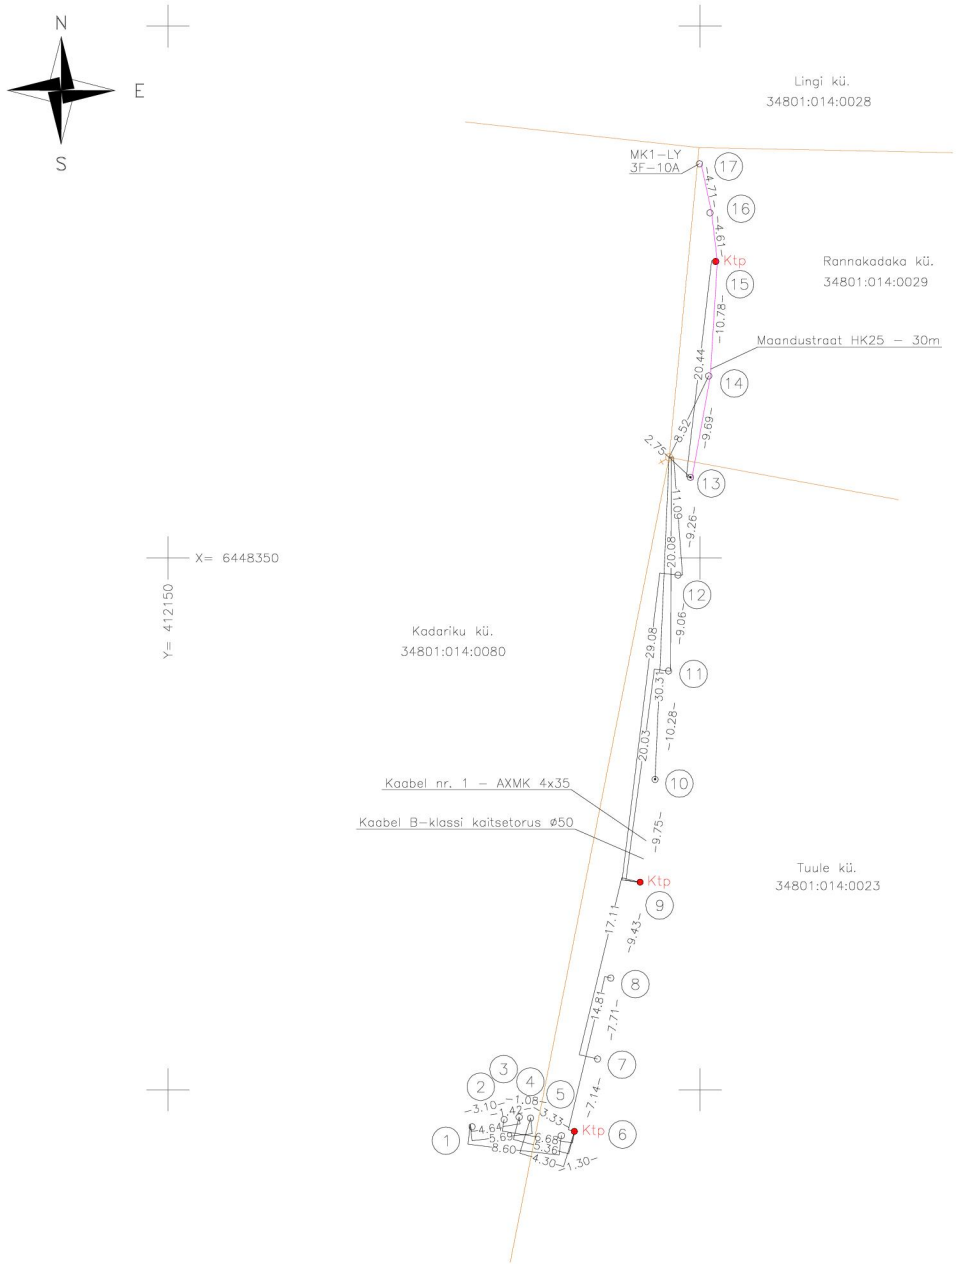

Kaabli nr. 1, AXMK 4*35, 102.650 m. Kaablipunktide koordinaadid:							
Lõigu algus					Lõigu lõpp		
Kp nr.	x-koordinaat	y-koordinaat	z-koordinaat	h(m)	Kp nr.	x-koordinaat	y-koordinaat
1	6448296.525	412178.569	1.09	0.50	2	6448297.197	412181.594
2	6448297.197	412181.594	0.90	0.50	3	6448297.426	412182.995
3	6448297.426	412182.995	0.93	0.50	4	6448297.337	412184.068
4	6448297.337	412184.068	0.99	0.50	5	6448295.678	412186.955
5	6448295.678	412186.955	1.02	0.53	6	6448296.088	412188.185
6	6448296.088	412188.185	0.92	0.55	7	6448302.888	412190.365
7	6448302.888	412190.365	1.07	0.42	8	6448310.502	412191.602
8	6448310.502	412191.602	1.13	0.45	9	6448319.522	412194.362
9	6448319.522	412194.362	1.01	0.50	10	6448329.171	412195.771
10	6448329.171	412195.771	1.05	0.50	11	6448339.371	412197.025
11	6448339.371	412197.025	1.06	0.50	12	6448348.387	412197.913
12	6448348.387	412197.913	1.04	0.50	13	6448357.575	412199.097
13	6448357.575	412199.097	1.09	0.50	14	6448367.111	412200.803
14	6448367.111	412200.803	1.16	0.50	15	6448377.872	412201.466
15	6448377.872	412201.466	1.14	0.50	16	6448382.449	412200.928
16	6448382.449	412200.928	1.07	0.50	17	6448387.057	412199.944
17	6448387.057	412199.944	1.07	0.50			

Ehitaja: Eltel Networks AS (september 2005)
Märkus: Koordinaadid L-EST '97 süsteemis, kõrgused balti süsteemis

GRGM Projekt OÜ			JAOTUSVÕRK OÜ			
KONTROLLIS	E. SEPP		KAARMA VALLAS ABRUKA KÜLA LINGI KÜ. TOITE MADALPINGEKAABLI TEOSTUSJOONIS	MÕÕT.	LEHT	LEHTI
TEGIJA	O. OESELG			1:500	1	1
KUUPÄEV	12.10.2005			GRGM Projekt OÜ Kuressaare Ranna tn. 36-31 TEL. 45 21 998 GSM 56 492 598 Litsentsi number EEG000021		
Abruka-Lingi elekter.dwg						
TÖÖ NR. T-146						
